

Livellazione Fiume SERCHIO a ponte S. Quirico



Caposaldo 1 – Km 13 SS12
Muro sostegno sx fosso vicino fontana



Caposaldo 2 - Km 14.2 SS12
Basamento Gas davanti scuola



Caposaldo 3 – Km 15 SS12
Pietra angolo casa – incrocio via Fattori



Caposaldo 4 – Km 16.1 SS12
Alla base della spalla ponte autostrada




Caposaldo 5 – km 17.3 SS12
Tombino



Caposaldo 6 – Km 18.3 SS12
Sommità parapetto ponte per Montuolo

Livellazione Fiume SERCHIO a ponte S. Quirico

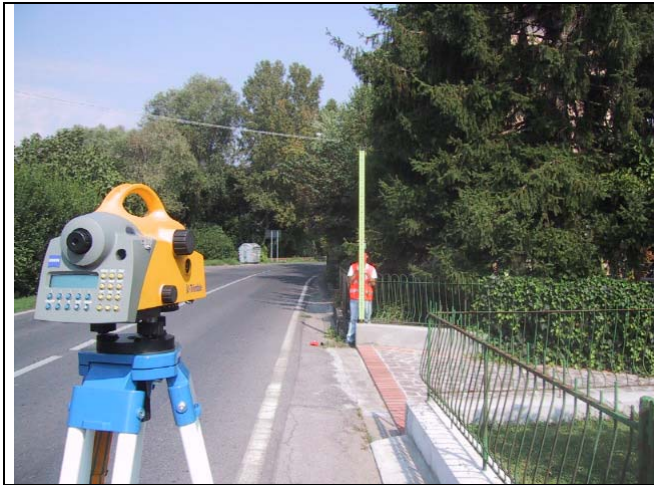

Caposaldo 7 – km 19 SS12
Muro di cinta civico 3421



Caposaldo 8 – Km 19.9 SS12
Alla base del muro ponticello civico 2471



Caposaldo 9 – Km 21 SS12
Sommità muretto all'incrocio



Caposaldo 10
Sommità muretto cinta villa angolo via Roana



Caposaldo 11
Circonvallazione Lucca



Caposaldo 12
Sopra muretto aiuola – Banca Toscana

Livellazione Fiume SERCHIO a ponte S. Quirico



Caposaldo 13



Caposaldo 14



IGM Foglio 104 – Area Pisana - n°112
km 11 SS12 chiesa di San Marco



IGM Foglio 104 – Area Pisana - n°113
Km 0.2 strada 4 venti – Molino di Quosa

Livellazione Fiume SERCHIO a ponte S. Quirico

	quota	DISLIVELLO	DISTANZ E	PROGRESSIV E
IGM113	24.94560	0	0	0
C1	12.42856	-12.51704	1398	1398
C2	9.33695	-3.09161	1222	2620
C3	13.00243	3.66548	844	3464
C4	14.58961	1.58719	1116	4581
C5	13.97734	-0.61228	1146	5726
C6	14.95442	0.97708	991	6718
C7	13.00173	-1.95269	735	7452
C8	12.76252	-0.23921	930	8383
C9	13.90542	1.14290	1195	9578
C10	15.35926	1.45384	974	10552
C11	17.53057	2.17131	1138	11690
C12	18.93265	1.40208	1005	12695
C13	27.20330	8.27065	875	13570
C14	26.14249	-1.06081	217	13786

dislivello totale metri **1.19689**

	quota	DISLIVELLO	DISTANZ E	PROGRESSIV E
IGM113	24.94560	0	0	0
IGM112	8.92779	-16.01781	1072	1072

dislivello totale metri **-16.01781**
